



■ 岡崎市からのお知らせです


昨年9月21日から行ってきました夜間工事は、平成31年3月末をもちましてトンネル天井部分の工事が概ね完了となります。(2019年11月から線路上での夜間工事をを行います。)

夜間工事では、近隣の皆様には大変ご不便をお掛けしましたが、皆様のご協力により事故等もなく工事を進めることができました。改めて感謝を申し上げます。

4月からは、夜間工事で施工したエレメント内部にコンクリートを詰める工事、5月からは、立坑を掘り下げる工事(立坑掘削工事(二次))を予定しています。いずれの工事も昼間に作業を行いますので、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。


今回の「柱町線ニュース」の内容は、立坑掘削工事(二次)の説明です。

■ 現在の工事状況写真

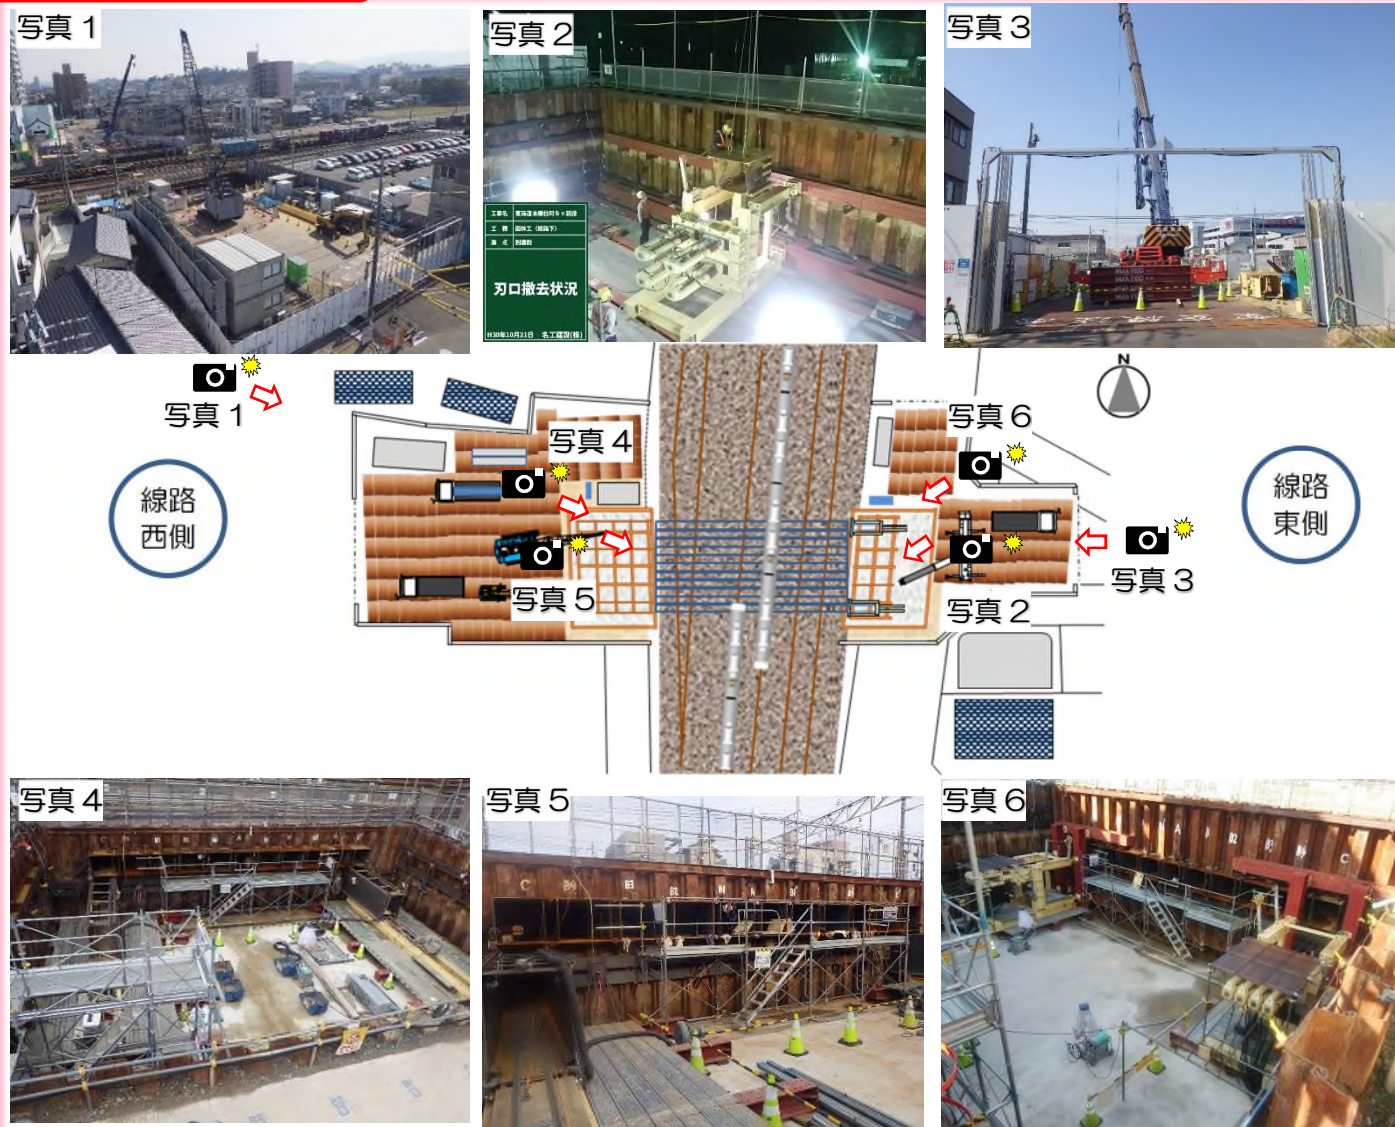

■ 立坑掘削工事(二次)

立坑掘削工事(二次)は、側壁エレメントと下床版工事を行うために、トンネルの底面までの掘削と立坑を支えるためのグラウンドアンカーの施工を行います。



【土砂運搬経路】

立坑掘削工事に伴い、下図に赤色の点線で示す運搬ルートでは、掘削した土砂を搬出するため、ダンプトラックの往来が増加します。

ダンプトラックの運行には細心の注意を払って安全運転に努めてまいります。



■ 今後の予定

【工事】

2019年11月から線路上での夜間工事をを行います。

【柱町線ニュース】

次号ではトンネル工事(その3)(側壁エレメント施工)の説明を予定しています。

■ 連絡先

事業主体：岡崎市都市整備部市街地整備課技術係 Tel.0564-23-6286 担当 都筑

工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事部

施工業者：名工建設株式会社 柱町Bv作業所 Tel.0564-73-1075 担当 柘植、上原

「柱町線ニュース」は地域の皆さまへ、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。ご意見、ご感想などがございましたらご連絡下さい。皆様からの温かい情報をお待ちしております。
